




# NEAT: Änderungen und deren Ursachen inkl. Risikoanteil BAV

**Änderungen:  
+5,7 Mrd. Fr.**

- Ursprüngliche Kostenbezugsbasis (12,2 Mrd.)
- Sicherheit und Stand der Technik (2,5 Mrd.)
- Verbesserungen für Bevölkerung und Umwelt (0,5 Mrd.)
- Politisch begründete Verzögerungen (0,3 Mrd.)
- Geologie (0,9 Mrd.)
- Vergabe und Bauausführung (1,3 Mrd.)
- Projekterweiterung (0,1 Mrd.)

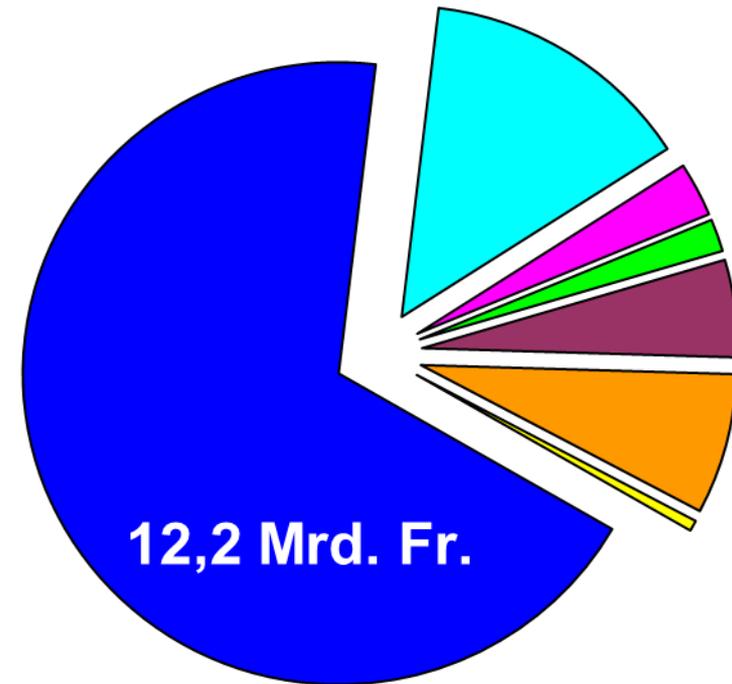

Alle Beträge in Millionen Franken (gerundet), Preisstand 1998, Stand 31. Dezember 2015

**NEAT-Endkostenprognose:  
17,9 Mrd. Franken**

Stand 31.12.2015
